
INFORME DE EVALUACIÓN DE JULIO-DICIEMBRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Sub-Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

Introducción

La Liga Municipal Dominicana, presenta, el informe de Evaluación de Medio Terminó del Plan Operativo Anual (POA)- 2020, con fundamento en los informes semestrales: Julio-Diciembre, formulados por la Sub-secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional en el Marco de las Normas y regulaciones del sistema nacional de Planificación e Inversión Pública.

Introducción Resumen Plan Operativo Anual 2020 Medio Tiempo, Semestre: Julio-Diciembre 2020

Los detalles de este informe figuran en los informes semestrales del Plan Operativo Anual 2020, correspondiente al semestre julio - diciembre, con base a las informaciones suministradas por las aéreas que conforman la estructura administrativa de la entidad y el Programa Dominicana Limpia.

Resultados por Números de Productos y Actividades

Las Actividades de los Productos Debido a la Pandemia del Covi-19 que nos ha afectado en nuestro país han bajado considerablemente en El Plan Operativo Anual 2020, es consistente con el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 en cuanto a sus líneas estratégicas y componentes.


Se integran en el POA de la manera que indica el cuadro.

1.1. RESULTADOS POR NÚMERO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

LÍNEAS	Cantidad de productos del año	Cantidad de producto del 3 Trimestre	Cantidad de producto del 4 Trimestre	Cantidad de actividades del año	Cantidad de actividades del 3 Trimestre	Cantidad de actividades del 4 Trimestre
I. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	52	27	25	113	59	54
II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD	37	24	13	72	37	35
III. CONTROL Y TRANSPARENCIA	16		16	67	35	32
IV. CAPACITACIÓN	12	8	4	16	10	6
V. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	10	7	38	22	16
Total	134	69	65	306	163	143


1. Grafica de ejecución de los Productos del POA, Segundo Semestre

% De Actividades Ejecutadas por Líneas Estratégicas

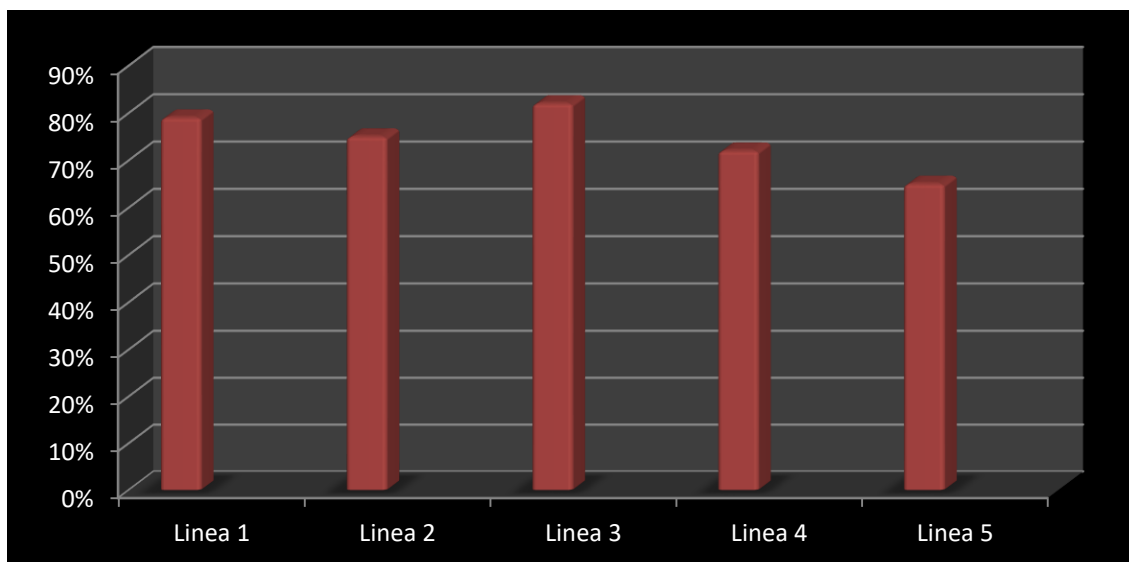

2. Grafica de Ejecución de las Actividades de los Productos del POA 2020, Segundo Semestre

% Productos Ejecutados por Línea Estratégica

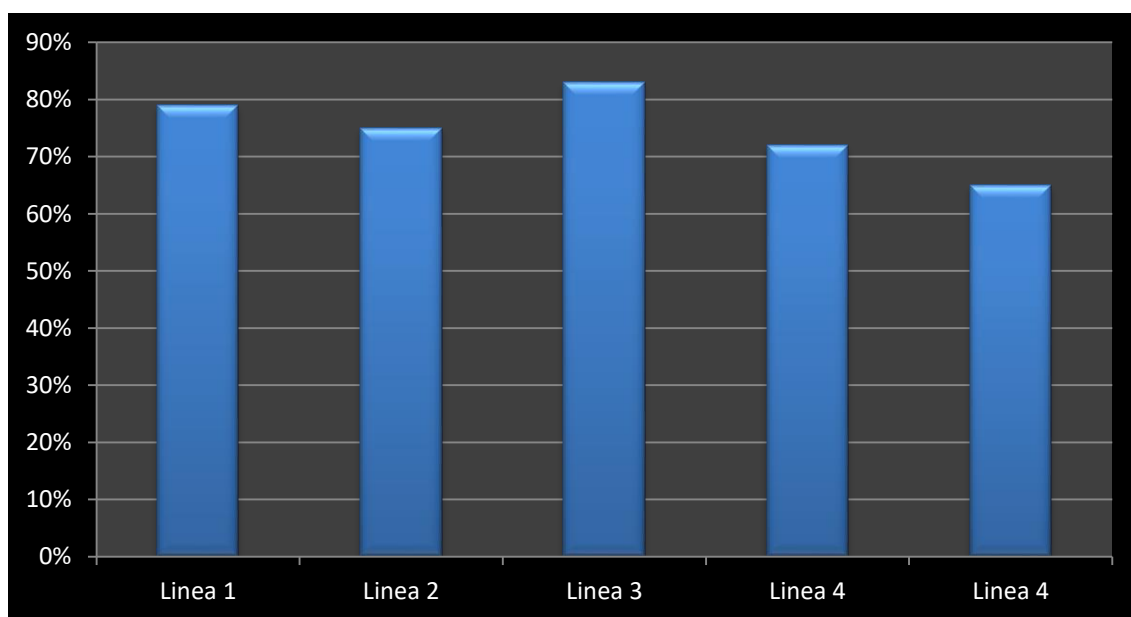

LÍNEA ESTRATÉGICA I. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por las aéreas dependientes de la Secretaría General.

En esta línea No. 1 fueron programados 52 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN 2 Semestre	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN 2 Semestre	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	POA 2020 a Diciembre
DIRECCION Y COORDINACION							
SECRETARIA GENERAL	6	6	9	6	25%	24%	49%
COMITÉ EJECUTIVO	5	4	13	12	25%	24%	49%
DIRECCIÓN JURÍDICA	6	6	19	8	25%	21%	46%
RELACIONES INTERNACIONALES	1	1	7	7	25%	-	-
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	3	3	10	3	25%	19%	44%
PROTOCOLO	2	2	9	9	25%	23%	48%
OFICINA DE LIBRE ACCESO	1	1	5	4	25%	18%	43%
INFORMACIÓN	5	4	22	13	25%	15%	40%
DIRECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	1	3	2	25%	18%	43%
SECCIÓN DE CONTROL ADMINISTRATIVO	7	5	26	8	25%	25%	50%
FINANCIERO	COMPONENTE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y SISTEMAS						
SUB-SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4	4	9	9	25%	25%	50%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS						
SUB-SECRETARIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	4	4	20	18	25%	25%	50%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3	1	13	2	23%	24%	47%
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	4	3	14	12	25%	25%	50%
TOTALES	52	45	179	113			

LÍNEA ESTRATÉGICA II. SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por la Subsecretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal y sus áreas dependientes.

En esta línea No. 2 fueron programados 37 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	POA 2020 a Diciembre
COMPONENTE I y II. GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL/ SEGURIDAD CIUDADANA/MCPIO SOLIDARIO							
SUB-SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL	4	4	8	5	25%	25%	50%
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	4	4	25%	20%	45%
MUNICIPALES DIVISIÓN DE ASESORÍA SEGURIDAD CIUDADANA (POLICÍAS Y BOMBEROS)	4	4	11	7	25%	17%	42%
Sección de Gestión Ambiental	4	4	7	7	25%	17%	42%
COMPONENTE III ELABORACIÓN DE NORMATIVAS							
Sub-Secretaría de Gestión y Asistencia Técnica Municipal	3	3	20	12	25%	25%	50%
COMPONENTE IV.ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL EN GESTION DE SERVICIOS PROGRAMAS ESPECIALES/PLAN PLURIANUAL SECTOR PUBLICO							
Departamento de Programas Especiales para los Gobiernos Locales/División de Seguimiento y Control de Proyectos	5	3	15	12	25%	17%	42%
SUB-SECRETARIA DE APOYO MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL	4	4	6	6	25%	21%	46%
DEPTO. DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES	2	2	10	10	25%	20%	45%
COMPONENTE V.OBSERVATORIO MUNICIPAL/SISMAP MUNICIPAL/MEDICIÓN DESEMPEÑO-GRADO SATISFACCIÓN							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL	8	3	13	6	25%	11%	36%
COMPONENTE VI.PROYECTO DOMINICANA LIMPIA							
OFICINA DE ENLACE CON LOS AYUNTAMIENTOS	2	2	3	3	25%	18%	42%
PROYECTO DOMINICANA LIMPIA	17	74					
TOTALES	37	38	97	72			

PROYECTO DOMINICANA LIMPIA

EJE 1. EDUCACIÓN Y CAMBIO CULTURAL EN LA SOCIEDAD

Para el Segundo semestre se vio afectada debido a los contagios del covi-19, debido a que se están dando clases virtuales, este eje se ha concentrado en:

- a) Consecución del proceso de sensibilización y capacitación a la ciudadanía a través de los núcleos de reciclaje promoviendo la separación en la fuente.
- b) Consecución proceso de sensibilización y capacitación a la comunidad educativa (personal de Ministerio de Educación, docentes y alumnos).
- c) Instalación de Puntos Limpios en los Centros Escolares.

EJE 2. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Vertedero de Villa Altagracia

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Villa Altagracia iniciaron el día 1ro de agosto 2018

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre - Diciembre 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

- 1. Manejo diario de los residuos sólidos urbanos que llegan al vertedero.
- 2. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
- 3. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
- 4. Acondicionamiento de plataforma de tiro.
- 5. Limpieza General.
- 6. Limpieza de cunetas existentes.
- 7. Estabilización de residuos.
- 8. Cobertura de residuos con capas de material local de 60 cm.
- 9. Construcción centro de acopio
- 10. Construcción estación de transferencia.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Villa Altagracia

Actividad	Avance (%)
Clausura	85
Estación de Transferencia	90
Centro De Acopio	90
Sistema de recolección de Lixiviados	100
Vías de Acceso	90

Este porcentaje de avance general es de: 91% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Verón

Los trabajos de intervención del vertedero de Verón iniciaron el 09 de octubre de 2018

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre - Diciembre 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.
2. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
3. Inicio del acondicionamiento de vías de acceso al vertedero.
4. Inicio acondicionamiento de área de oficina.
5. Recuperación de Áreas
6. Apagado de fuegos en vertedero

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Verón

Actividad	Avance %
Clausura	40
Habilitación Vías De Acceso	58

Este porcentaje de avance general es de: 49% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Tamboril

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Tamboril iniciaron el día 14 de noviembre 2018 y fueron pausadas en junio del 2019 hasta la culminación de la construcción estación de transferencia de residuos sólidos urbanos, esta llevara los residuos sólidos desde tamboril hasta el vertedero de Rafey

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre - Diciembre 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
2. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
3. Acondicionamiento de plataforma de tiro.
4. Limpieza General.
5. Limpieza de cunetas existentes.
6. Estabilización de residuos.
7. Cobertura de residuos con capas de material local de 20 cm. En la aplicación de la primera capa. Restan 40 cm de material aplicado.

8. Levantamiento topográfico.
9. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.
10. Corte de Talud en la parte superior del Vertedero.
11. Cobertura de los residuos con el material obtenido del corte.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Tamboril

Actividad	Avance (%)
Clausura	65
Conformación de residuos	75
Estación de Transferencia	15
Drenaje Pluvial	80
Vías de Acceso	65
Construcción de Parque Mirador	40

Este porcentaje de avance general es de: 57% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Puerto Plata

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Puerto Plata iniciaron el día 26 de marzo del 2019

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre - Diciembre 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
2. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
3. Acondicionamiento de plataforma de tiro.
4. Limpieza General.
5. Limpieza de cunetas existentes.
6. Estabilización de residuos.
7. Cobertura de residuos con capas de material local de 60 cm.
8. Levantamiento topográfico.
9. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Puerto Plata

Actividad	Avance (%)
Clausura	30
Sistema de recolección de Lixiviados	0
Vías de Acceso	40

Este porcentaje de avance general es de: 25% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Hato del Yaqué

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Hato del Yaqué iniciaron el día 22 de enero del 2020

Para el Vertedero de Hato del Yaqué se licito la construcción de la estación de transferencia de residuo sólidos urbanos que permitirá que los RSU sean trasladados hasta el vertedero semicontrolado Rafey y el saneamiento y Clausura del vertedero existente.

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre - Diciembre 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Delimitación de zonas de construcción de estación de transferencia.
2. Levantamiento topográfico.
3. Limpieza en área de construcción de la estación de transferencia.
4. Acondicionamiento de plataforma de tiro.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero

Actividad	Avance (%)
Clausura	30
Estación de Transferencia (Oficina de operación, Verja Perimetral)	45

Este porcentaje de avance general es de: 37.5% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Bani

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Bani iniciaron el día 30 de enero del 2020

Para el Vertedero de Bani se licito la construcción del centro de acopio de multimateriales con capacidad para procesar 30 toneladas/día de residuos sólidos urbanos, saneamiento del vertedero, construcción de la celda de vertido de RSU con una vida útil de dos años recibiendo 350 toneladas/día y colocación de verja perimetral para el cerramiento del vertedero con una longitud total de 1243.26 metros lineales.

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre - Diciembre 2020

DETALLES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Levantamiento topográfico.
2. Limpieza en área de construcción de celda.
3. Limpieza de área construcción centro de acopio.

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero

Actividad	Avance (%)
Clausura	30
Centro de acopio	40
Celda de RSU	60
Verja perimetral	20

Este porcentaje de avance general es de: 37.5%

Vertedero de Azua

Azua se incluyó el proyecto de Mejoramiento del Sitio de Disposición de Residuos Urbanos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) con un monto asignado de RD\$ 40, 997,505.18. Luego de agotar los procesos de compra, establecidos por ley, la intervención del vertedero inició el 15 de mayo del año 2019, con la construcción del centro de acopio de Multimateriales para la clasificación y valorización de los mismo, con un área Aproximada de 432 metros cuadrados, la verja perimetral, adquisición de retro pala para completar el kit de equipos para la operación del vertedero y recuperación de áreas impactadas. Actualmente este proyecto presenta un nivel de avance de un 53%.

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre - Diciembre 2020

Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero

Actividad	Avance (%)
Centro de acopio	70
Compra de retro pala	100
Celda de RSU	20
Recuperación de caminos internos	100
Recuperación de áreas impactadas	40
Taller de mantenimiento	0
Verja perimetral	40

Este porcentaje de avance general es de: 53% del total de las actividades de la obra.

Vertedero de Rafey (Santiago)

Fue Incluido al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) el proyecto de “MEJORAMIENTO DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS URBANOS DE SANTIAGO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS” bajo el código No.14143, el mismo fue formulado por los técnicos de Dominicana Limpia y los del Ayuntamiento Municipal de Santiago por un monto total de RD\$ 65, 328,582.12

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Rafey iniciaron el día 12 de Agosto del 2019

Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre - Diciembre 2020


Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero

Actividad	Avance (%)
Verja perimetral	100
Colocación de Pozos de Biogás	100
Recuperación de caminos internos	85
Taller de mantenimiento	80
Sistema de recolección de lixiviados	65
Reparación de equipos pesados	10
Pozos piezómetros para verificación de la infiltración del lixiviado	0

Este porcentaje de avance general es de: 62.85% del total de las actividades de la obra.

RESUMEN PORCENTAJE DE AVANCES ACTIVIDADES EN LOS VERTEDEROS

VILLA ALTAGRACIA	91%
VERÓN	49%
TAMBORIL	57%
PUERTO PLATA	25%
HATO DEL YAQUE	37.5%
BANI	37.5%
AZUA	53%
SANTIAGO	62.85%

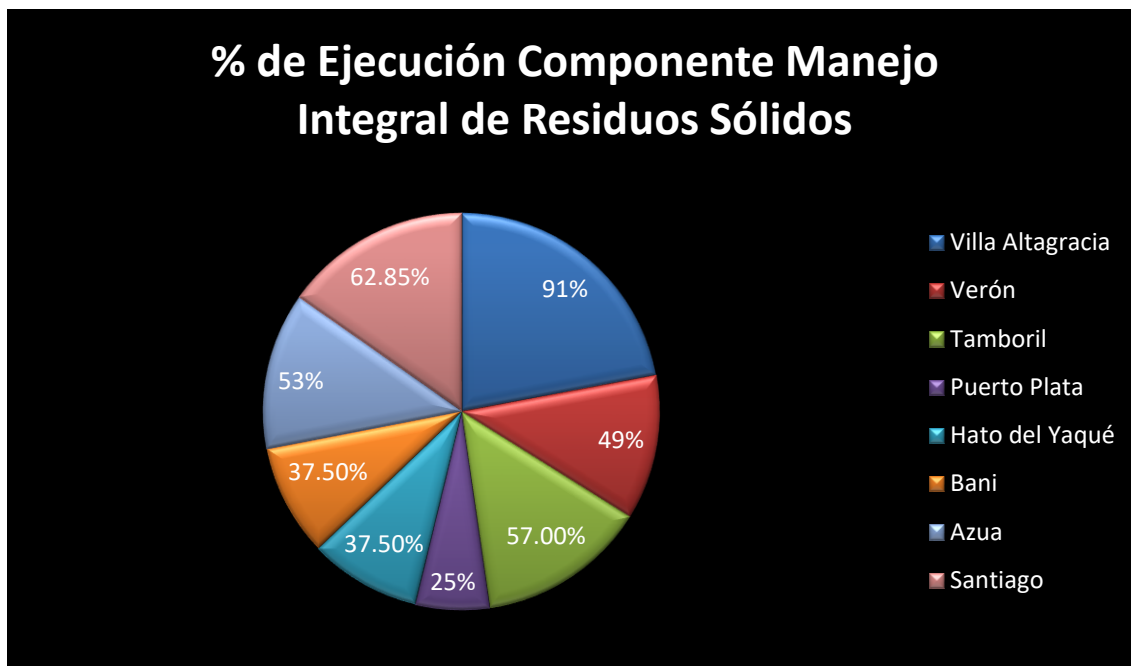

1. Construcción de Rellenos Sanitarios/ Clausura Botadero a Cielo Abierto
2. Cambio cultural en la Sociedad dominicana
3. Impulsar la capacidad en los dos niveles de gobierno

LÍNEA ESTRATÉGICA III. CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades desarrolladas por la Subsecretaría Administrativa-Financiera y sus aéreas dependientes.

En esta línea No. 3 fueron programados 16 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	POA 2020 a Diciembre
COMPONENTE SERVICIOS FINANCIEROS							
Sub-Secretaría Administrativa Financiera	1	1	4	4	25%	25%	50%
Dirección Financiera	3	1	13	13	25%	24%	49%
Departamento de Tesorería	1	1	3	3	25%	21%	46%
Departamento contabilidad	2	2	9	9	25%	25%	50%
Sección de Activo Fijo	1	1	5	5	25%	22%	47%
Departamento	1	1	1	1	17%	21%	38%

de Aduanas y Exoneraciones	COMPONENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
Departamento de compras y contrataciones	2	2	13	13	25%	25%	50%
Departamento de Servicios Generales	1	1	3	3	23%	19%	42%
Sección de Almacén y Suministro	2	2	9	9	24%	22%	46%
Departamento de Transportación	1	1	3	3	20%	23%	43%
Sección de Archivo y Correspondencia	1	1	4	4	19%	21%	40%
TOTALES	16	14	67	67			

LÍNEA ESTRATÉGICA IV. CAPACITACION

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades formativas encaminadas y ejecutadas por la Dirección de Capacitación y Formación a los Gobiernos Locales.

En esta línea No. 4 fueron programados 12 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	POA 2020 a Diciembre
COMPONENTE CAPACITACIÓN							
DIRECCIÓN DE CAPACITACION MUNICIPAL	12	11	19	16	24%	16%	40%
TOTALES	12	11	19	16			

LÍNEA ESTRATÉGICA V. COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO

Los datos del cuadro que acompañan esta Línea, resulta, de las informaciones generadas de las diferentes actividades formativas ejecutadas por la Dirección de Capacitación y Formación a los Gobiernos Locales.

En esta línea No. 5 fueron programados 17 productos, de los cuales se lograron los siguientes:

DEPARTAMENTO	PRODUCTOS PROYECTADOS	PRODUCTOS EN EJECUCIÓN	ACTIVIDADES PROYECTADAS	ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	POA 2020 a Junio
COMPONENTE I COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA	6	2	16	5	15%	27%	42%
	1	1	5	5	10%	11%	21%
COMPONENTE II INSTALACIÓN Y USO DE LAS TICS							
	2	2	17	8	15%	16%	31%
	5	4	22	13	10%	17%	27%
COMPONENTE III. OBSERVATORIO MUNICIPAL-UNIDAD DE ESTADISTICA							
OFICINA DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL	2	2	13	5	10%	25%	35%
COMPONENTE IV. MESA TÉCNICA							
MESA TÉCNICA INSTITUCIONAL	1	1	6	2	25%	25%	50%
TOTALES	17	12	79	38			




Liga Municipal Dominicana

Elaboración:


Licdo. Daniel Ureña Mitchell
Subsecretario de Planificación y Desarrollo Institucional

Revisión /Aprobación


Licdo. Víctor Manuel Feliz Solano
Subsecretario de Gestión y Asistencia Técnica Municipal


Ing. Johnny Jones Luciano
Secretario General

