

# INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DOMINICANA LIMPIA  
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019



**Ing. Jorge Luis Bisonó**  
**Director Ejecutivo**



# Contenido

1. Destino Final.....	2
1.1 Informe Técnico Vertedero de Villa Altagracia .....	2
1.2 Informe Técnico Vertedero de Verón .....	4
1.3 Informe Técnico Vertedero de Tamboril.....	9
1.4 Informe Técnico Vertedero de Puerto Plata .....	10
1.5 Resumen porcentaje de avances actividades en los vertederos.....	13
2. Transportación y equipos pesados .....	14
2.1 Informe de Servicios ofrecidos.....	14
3. Componente Educativo.....	16
3.1 Taller de manejo de plataforma de seguimiento Plan Dominicana Limpia y Coaching motivacional a coordinadores y promotores 5 y 6 de noviembre .....	16
3.2 Sensibilización virtual sobre manejo de residuos sólidos para formar los Escuadrones Ambientales. ....	16
4. Eventos y actividades .....	18
4.1 Entrega de 21 camiones para el transporte y manejo separado en el destino final de los desechos -12 de noviembre de 2019. ....	18
.....	18

## 1. Destino Final

### 1.1 Informe Técnico Vertedero de Villa Altagracia

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Villa Altagracia iniciaron el día 1ro de agosto 2018. Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre – Diciembre 2019

#### DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
2. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
3. Acondicionamiento de plataforma de tiro.
4. Limpieza General.
5. Limpieza de cunetas existentes.
6. Estabilización de residuos.
7. Cobertura de residuos con capas de material local de 60 cm.
8. Levantamiento topográfico.
9. Limpieza área para estación de transferencia y centro de acopio.
10. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.

#### Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Villa Altagracia

Actividad	Avance (%)
Clausura	80
Estación de Transferencia	25
Centro De Acopio	25
Sistema de recolección de Lixiviados	80
Vías de Acceso	90

*Este porcentaje de avance general es de: 60% del total de las actividades de la obra.*

#### Infografía





### Construcción de Registros de Inspección recolección de lixiviados En Vertedero de Villa Altagracia



### 1.2 Informe Técnico Vertedero de Verón

Los trabajos de intervención del vertedero de Verón iniciaron el 09 de octubre de 2018. Las actividades que se han realizado corresponden con el trimestre Octubre – Diciembre 2019

#### DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Desbloqueo de las internas del vertedero.
2. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
3. Inicio del acondicionamiento de vías de acceso al vertedero.
4. Inicio acondicionamiento de área de oficina.
5. Inicio del acondicionamiento de mina.
6. Recuperación de Áreas

- 7. Apagado de fuegos en vertedero
- 8. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.


**Avance en porcentaje de las obras a entregar en Verón.**

<b>Actividad</b>	<b>Avance %</b>
Clausura	<b>40</b>
Habilitación Vías De Acceso	<b>58</b>
Verja Perimetral	<b>5</b>

*Este porcentaje de avance general es de: 35% del total de las actividades de la obra.*

**Infografía de los avances**



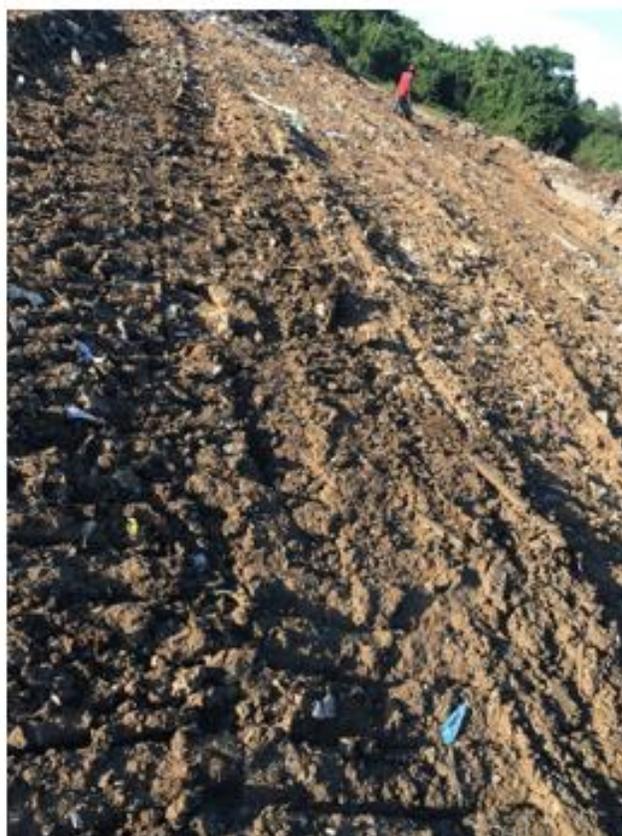

**Actualidad**





### 1.3 Informe Técnico Vertedero de Tamboril

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Tamboril iniciaron el día 14 de noviembre 2018. Las actividades que se han realizado corresponden al trimestre Octubre – Diciembre 2019.

#### DETALLES DE LAS ACTIVIDADES

1. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
2. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
3. Acondicionamiento de plataforma de tiro.
4. Limpieza General.
5. Limpieza de cunetas existentes.
6. Estabilización de residuos.
7. Cobertura de residuos con capas de material local de 20 cm. En la aplicación de la primera capa. Restan 40 cm de material aplicado.
8. Levantamiento topográfico.
9. Determinación de área para estación de transferencia.
10. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.
11. Corte de Talud en la parte superior del Vertedero.
12. Cobertura de los residuos con el material obtenido del corte.

#### Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Tamboril

Actividad	Avance (%)
Clausura	60
Conformación de residuos	75
Estación de Transferencia	15
Cunetas de recolección de Lixiviados	10
Vías de Acceso	65
Construcción de Parque Mirador	20

*Este porcentaje de avance general es de: 45% del total de las actividades de la obra.*

#### Infografía de los avances





#### 1.4 Informe Técnico Vertedero de Puerto Plata

Los trabajos de intervención en el Vertedero de Puerto Plata iniciaron el día 26 de marzo del año en curso. Las actividades que se han realizado corresponden a los días del mes en actividad.

##### **DETALLES DE LAS ACTIVIDADES**

1. Manejo de las aguas residuales alrededor del vertedero y dentro del mismo.
2. Acondicionamiento de Vías de acceso al vertedero.
3. Acondicionamiento de plataforma de tiro.

4. Limpieza General.
5. Limpieza de cunetas existentes.
6. Estabilización de residuos.
7. Cobertura de residuos con capas de material local de 60 cm.
8. Levantamiento topográfico.
9. Manejo de los residuos que llegan al vertedero.

#### **Avance en porcentaje de las obras a entregar en Vertedero Puerto Plata**

<b>Actividad</b>	<b>Avance (%)</b>
Clausura	30
Sistema de recolección de Lixiviados	0
Vías de Acceso	40

***Este porcentaje de avance general es de: 25% del total de las actividades de la obra.***

#### **Infografía de los avances**





### 1.5 Resumen porcentaje de avances actividades en los vertederos.

<b>VILLA ALTAGRACIA</b>	<b>60%</b>
<b>VERON</b>	<b>35%</b>
<b>TAMBORIL</b>	<b>45%</b>
<b>PUERTO PLATA</b>	<b>25%</b>

#### **OBSERVACIONES**

Se realizaron los procesos de licitación para los siguientes casos:

- Para el Vertedero de Tamboril la revegetación del vertedero y la conformación de un mirador en la parte superior de este. Se adjudicó a la empresa ganadora. El cheque correspondiente al 20% está en trámite.
- Para el Vertedero de Bani se licito la construcción del centro de acopio, saneamiento del vertedero y construcción de la celda. Se adjudicó y se realizó la entrega del 20%.
- Para el Vertedero de Hato del Yaqué se licito la construcción de la estación de transferencia, saneamiento y Clausura. Se adjudicó y se realizó la entrega del 20%.

## 2. Transportación y equipos pesados

### 2.1 Informe de Servicios ofrecidos

Durante este periodo este departamento de transportación ha cumplido con las tareas asignadas de manera satisfactoria.

Continuamos transportando a los diferentes municipios, según solicitud de las diferentes unidades del Plan Dominicana Limpia, sin ningún contratiempo. Brindando puntualidad y tomando las medidas para que los vehículos tengan condiciones de limpieza, combustible, peaje y rodamiento adecuado para un viaje placentero.

Por otro lado, se inició la distribución hacia los primeros 22 territorios, asignados, dentro de los cuales: Villa Tapia, Verón, Sabana de La Mar, Constanza, Los Botados, Salcedo, San José de Ocoa, Moca, Bani, Jarabacoa, Azua, Cotuí, San Pedro de Macorís, Mao, Puerto Plata, entre otros.



Se le brindó transporte a los diferentes puntos limpios instalados en la geografía nacional.



Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos livianos y pesados a nuestro cargo.



### 3. Componente Educativo

#### 3.1 Taller de manejo de plataforma de seguimiento Plan Dominicana Limpia y Coaching motivacional a coordinadores y promotores 5 y 6 de noviembre

Este taller se llevó a cabo para darles herramienta al personal que trabajar en los territorios sobre cómo ser líderes de equipos, manejo de conflicto, inteligencia emocional etc. También se le dio un taller especializado en cómo saber usar la nueva plataforma de DL para subir sus evidencias.



PARTIPANTES	CANTIDAD
Coordinadores y digitadores	25
Promotores	66

#### 3.2 Sensibilización virtual sobre manejo de residuos sólidos para formar los Escuadrones Ambientales.

En el mes de noviembre se comenzó sensibilizar a través de la tecnología de realidad virtual o equivalente. Que tiene como finalidad la sensibilización a los estudiantes respecto a los principios básicos de las 3R's y el cambio de hábitos en la disposición final inadecuada de los residuos sólidos. La misma provee información sobre la importancia de la separación y disposición adecuada de los residuos sólidos y sobre la protección medioambiental. Se ha sensibilizado con esta tecnología 6048 estudiantes.



## 4. Eventos y actividades

### 4.1 Entrega de 21 camiones para el transporte y manejo separado en el destino final de los desechos -12 de noviembre de 2019.

Representantes del Plan Dominicana Limpia, hicieron entrega de 21 camiones para la misma cantidad de territorios, como parte de las acciones que tienen como objetivo ofrecer una solución integral a los problemas generados por los residuos sólidos.

La entrega fue encabezada por las instituciones que conforman el plan; la Cervecería Nacional Dominicana, la Liga Municipal Dominicana, la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia, FEDOMU y FEDODIM.

Los municipios y Distritos Municipales favorecidos con la entrega de camiones fueron: Baní, Constanza, Cotuí, Dajabón, Esperanza, Hato Mayor del Rey, Jarabacoa, Mao, Moca, Puerto Plata, Sabana de la Mar, Salcedo, San Francisco de Macorís, San José de Oca, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, Villa Jaragua, Villa Tapia y Los Botados, Verón.

